

シンバネットワーク協力事業平成28年度
市民の夢応援プロジェクト
まちづくりプラン賞活動報告会
平成29年7月8日



浦添グリーンハイツ自治会

1、まちづくりプラン賞応募主旨

- ▶ 自治会活動の拠点である公民館広場を緑化する
- ▶ 公民館広場は土がむき出しの状態なので晴天時は砂埃で公民館や周辺住宅から汚れの苦情がある。
また雨天時は泥んこになり数日は使用できない。
- ▶ 公民館隣接のアパート住民のプライバシー侵害が懸念されている。
- ▶ そこでまちづくりプラン賞を活用し、広場に芝生を植え、フェンスに蔦を這わせ広場の有効活用を目指す。

①浦添グリーンハイツ公民館のようす



正面玄関や道路沿い、広場周辺は
地域活動拠点として美化緑化を推進している。



②浦添グリーンハイツ公民館広場

子どもの遊び場、駐車場、夏祭り、ラジオ体操、集合場所に活用



縦25.4m、横13.3m、面積337.8m²（約102坪）

③雨が降ると使用できない広場



④晴天時は砂埃が立ち、周辺にたまる。 正面玄関階段にたまる砂埃

⑤ グリーンハイツ公民館隣のアパートのよう

隣接するアパート住人のプライバシー侵害が懸念される



アパート住民が
ビニールシート等で目隠し



⑥対応策

☆セントオーガスチン
グラスの植栽する



☆広場フェンス沿いにつる科植物を植栽する



活動報告と収支決算

活動実績報告書

浦添グリーンハイツ自治会

種 目	説 明
○プラン賞受賞 (H28 年 7 月 2 日)	平成 28 年「市民の夢応援プロジェクト～まちづくりプラン賞」のプレゼンテーションに参加し審査の結果 34 万円の助成金が決定した。
○芝生の発注 (H28 年 11 月 22 日)	業者に第一次植栽分 (225 m) 芝生を発注する。
○芝植栽事前作業 (H28 年 12 月 19 日)	植栽場所 (公民館広場) の土壌掘り起こし作業実施。会員有志 9 名参加、業者指導あり、所要時間 4 時間
○芝の植栽 (H28 年 12 月 20 日)	前日作業に引き続き会員有志 10 名で植栽作業、及びつる植物植栽実施、業者指導あり、所要時間 5 時間 同日、芝養生のため立ち入り禁止の杭打ち、ロープ張り
○第二次芝植栽作業 (H29 年 1 月 20 日)	広場遊具設置部分の一部 30 mに芝植栽、参加 3 名、業者指導あり、所要時間 2 時間
○散水作業 (12 月 20 日以降)	芝植栽後、H29 年 2 月中旬まで毎日散水作業実施
○芝用肥料施肥 (H29 年 1 月 20 日)	芝成長促進のため肥料購入し散布
○芝刈り作業 (H29 年 2 月 28 日)	H29 年 3 月 1 日の広場解放に向けて芝刈り機で芝刈り作業、及びつる植物ガード用の杭打ち、また立ち入り禁止のロープ撤去作業実施、会員有志 1 名参加
○公民館広場の解放 (H29 年 3 月 1 日)	いよいよ H29 年 3 月 1 日より広場解放した。当初 2 月 1 日を予定していたが芝の成長を勘案し 1 ケ月延期した。
○まちづくりプラン賞の成果	今まで晴天時は砂埃、雨天時は泥んことなる公民館広場が緑のじゅうたんに変貌しました。子どもや隣近所から喜ばれ地域住民の憩いの場所になります。

様式第7号 (第6条関係)

収 支 精 算 書 (浦添グリーンハイツ自治会)

収入の部

種 目	決 算 額	計 画 額	増 減	説 明
助成金	340,000	340,000	0	自治会負担
受賞者負担	12,096	47,592	△35,496	
寄付金	0	20,000	△20,000	
合計	352,096	407,592	△55,496	

支出の部

種 目	決 算 額	計 画 額	増 減	説 明
イヌ芝 (第1次)	225,000	225,000	0	領収N05参照
イヌ芝 (第2次)	30,000	81,000	△51,000	領収N07参照
つる植物 (一式)	9,600	9,400	200	領収N05参照
植栽指導料	17,000	17,000	0	領収N05参照
芝刈機 (一台)	24,056	45,000	△20,944	領収N01参照
作業機械借用	3,000	0	3,000	領収N02参照
白砂購入 (一台)	5,000	0	5,000	領収N03参照
芝用肥料 (3袋)	12,000	0	12,000	領収N06参照
雑費	360	0	360	領収N04参照
小計	326,016	377,400	△51,384	
消費税	26,080	30,192	△4,112	
合計	352,096	407,592	△55,496	

2、芝の広場づくり

①第1次芝搬入H28.12.16



2、芝の広場づくり

㊟ 広場土壌掘り起こし作業

H28.12.19



2、芝の広場づくり

⊗広場芝張り作業H28.12.20



2、広場の芝植栽

④芝張り後の砂撒き作業H28.12.20



⑤作業終了後散水H28.12.20

3、フェンスの緑化（蔓植物植栽）

㊟フェンス添いにつる科植物植栽H28.12.20



3、フェンスの緑化（蔓植物植栽）

㊦ つる植物ガード H22.12.28



ボールからのガード
誤って抜くことの防止
等


4、芝の養生

養生のため

ロープを張り立ち入り禁止H28.12.20



養生のための立ち入り禁止
H29年2月末まで続く

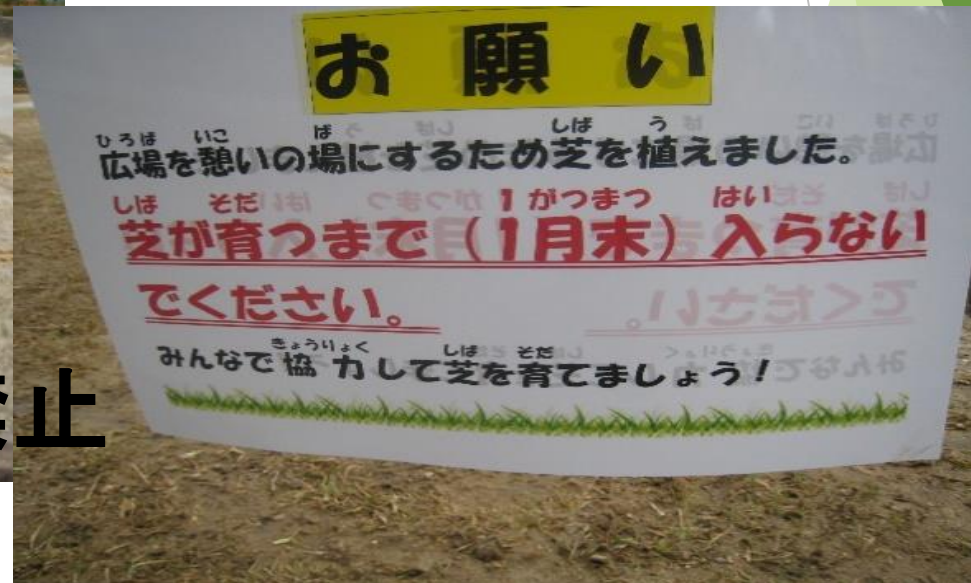

5、遊具周辺の芝植栽

第2次植栽作業H29.1.20



6、成長のようす

成長の様子㊟（1ヶ月後H29.1月中旬頃）



成長の様子㊟（2ヶ月後H29.2月中旬頃）



7、芝の手入れ

㊟芝刈り機購入H28.8.9



㊟芝用肥料購入



⊛芝刈り作業 (H29.2.28)



8、広場解放後の活用

①広場で遊ぶ子ども達（H29.3月初旬）



8、広場解放後の活用

②鯉のぼり掲揚式と前田小“まち探検”(H29年度)

