

まちづくりプラン賞〈経塚地域応募事業 実施報告〉 経塚百年経過、次代に繋ぐ「結いの心」モニュメントづくり

平成28年6月11日 経塚自治会

- ・趣旨：市街化著しい地域にあって、これまでどおりの地域活動するための核造り
- ・成果：除幕式参加者からは「イチャリバ兄弟」と「ユイマール」が経塚自治会のモットーであり、後輩にもこの精神を伝え、今後も明るい住みよい地域にしたいとの話があった。

○経過状況

2015年6月 記念碑に関し、まちづくりプラン賞に応募、約18万円の補助獲得

2015年10月 記念碑設置位置、デザインの決定


2015年12月 市に対し記念碑の設置許可申請及び設置工事の為の占用許可申請
工事発注 契約額50万円(税込み)

(中国産自然石 高108cm、幅60cm 上にロゴ、中央に結、下部に事業名)

2016年2月6日 記念碑設置工事完了

2016年2月21日 除幕式、祝賀会 参加者 約50名

位置

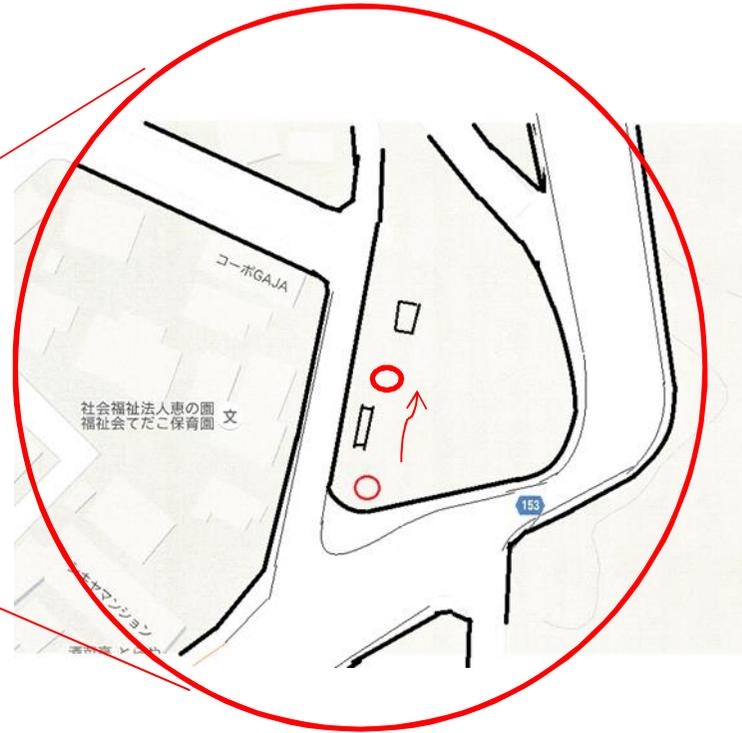

旧暦10月1日御松御願
(ウマーチヌウガン)

経塚の聖地「御経毛」とその周辺



金鼓隊の出陣祈願


○デザインの決定



1. テーマ

「経塚誕生百年から未来に向けて」結束のシンボル作り

2. テーマ設定の理由

- ・激変する環境: ベッドタウン化、区画整理 等
- ・自治会結束→「イチャリバ兄弟」と「結」の気持ちで未来の明るい経塚へと繋ぎたい

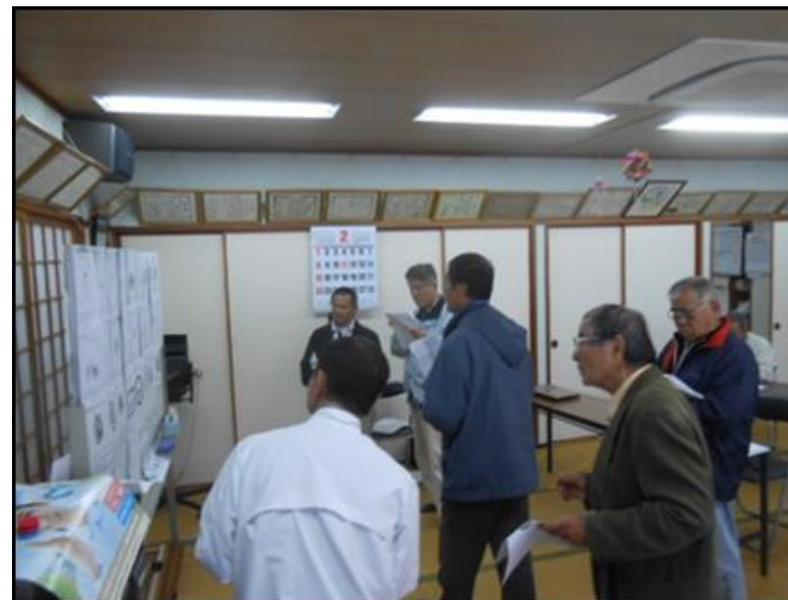

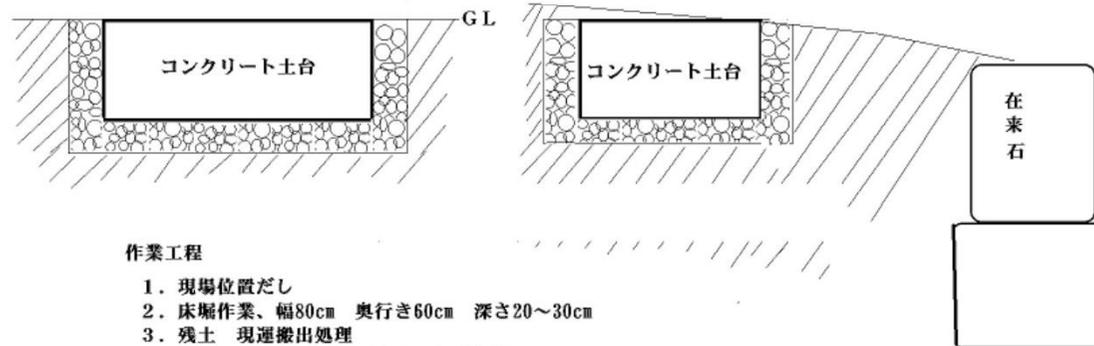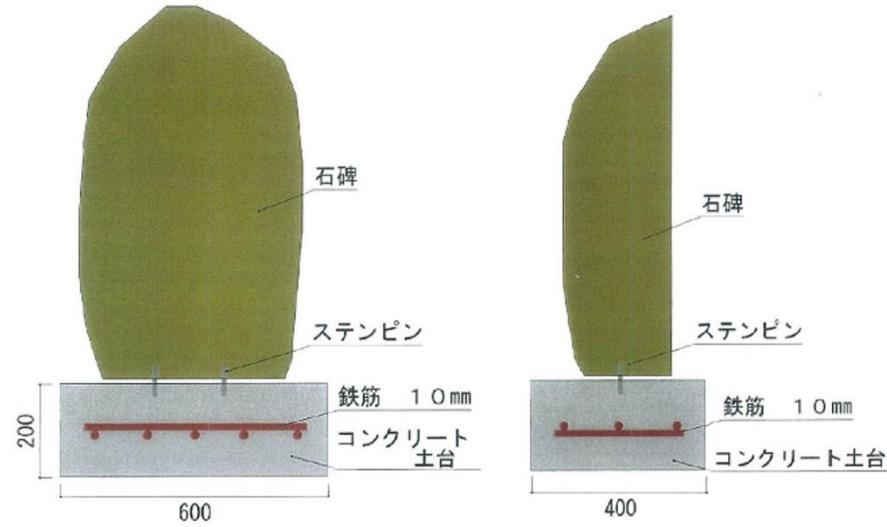

作業工程

1. 現場位置だし
2. 床堀作業、幅80cm 奥行き60cm 深さ20~30cm
3. 残土 現運搬出処理
4. 床掘 底面 コーラル敷き 押圧作業
5. コンクリート土台 仮枠作業
6. コンクリート土台 鉄筋組立作業 鉄筋13mm使用
7. コンクリート打設作業 (ミキサー機・セメント・砂・バラス使用)
8. コンクリート押さえ
9. 仮枠解体 資材現運搬出
10. 石碑 文字彫刻
11. 石碑設置作業 碑底面・コンクリ土台・ステン棒差込 (ボンド)
12. 碑底面・コンクリ土台・目地シリコン注入
13. コンクリ土台 上面・正面・側面 枝岩左官仕上げ
14. コンクリ土台 正面・側面・後面 隙間 埋土作業
15. 工事完了

収支精算書		
収入		(単位:円)
項 目	計画額	決算額
助成金(まちプラ賞)	179,000	179,000
受賞者負担金	250,000	259,643
寄付金	116,400	68,000
計	545,400	506,643
支出		(単位:円)
項 目	計画額	決算額
デザイン検討費	10,000	0
石代	400,000	350,000
製作費	40,000	80,000
設置費	40,000	70,000
諸経費	15,000	6,643
奉献酒2本・業務スーパー		2,427
除幕用紅白ロープ・メイクマン		1,216
古典演奏者謝金		3,000
消費税	40,400	0
計	545,400	506,643
		* 決算額は税込
収入－支出＝513,643円－513,643円＝0円		

活動計画書(当初)		(変更)
種 目	説 明	
デザインの検討	検討委員会を設置し、100年記念モニュメントの デザインを検討・決定し、設置位置を確定する。 8月1日～9月30日 委員会4回開催、デザイン決定	設置場所を北側へ 約10m移動
寄付依頼活動	不足金額について寄付願い 8月1日～12月31日 自治会員他有志に寄付金を募集し、 資金を造成する	
モニュメント発注	製作設置業者に発注する 12月7日 モニュメント作成設置契約締結 2月20日 モニュメント完成	2月6日完成
お披露目会	2月28日 除幕式	2月21日除幕式



記念碑設置前



記念碑設置後

経塚自治会はこれからも「イチャリバ兄弟」と「結(ゆい)まーる」を合言葉にいつまでも住みよい地域社会であるよう努めます。

○除幕式の状況



①除幕前



②実行委員長と自治会長による除幕



③姿を現した記念碑



④記念碑を囲んで記念写真、この後、祝賀会
